

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

Υπεύθυνος διδασκαλίας: **Αθανάσιος Χασιακός**

Επιμέλεια παρουσίασης: **Παναγιώτης Φαρμάκης**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ & ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσίαση:

- των μητρώων μελετητών & εργοληπτών του ΥΠΟΜΕΔΙ
- του νομικού πλαισίου που διέπει τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016)

ΣΤΟΧΟΣ

Η κατανόηση:

- των τυπικών προσόντων & προϋποθέσεων για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς εκπόνησης μελετών & κατασκευής έργων
- των βασικών αρχών που διέπουν την παραγωγή των δημοσίων έργων & μελετών

Μητρώα μελετητών δημοσίων έργων

Προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο μελετητών του ΥΠΟΜΕΔΙ:

- Δίπλωμα μηχανικού
- Εγγραφή στο ΤΕΕ
- Παρέλευση τετραετίας από τη λήψη του διπλώματος
- Μη εγγραφή στο μητρώο εργοληπτών

Τάξεις μελετητικών πτυχίων

- Α' (με την παρέλευση 4ετίας από τη λήψη πτυχίου)
- Β' (με την παρέλευση 8ετίας από την λήψη πτυχίου & εμπειρία)
- Γ' (με την παρέλευση 12ετίας από την λήψη πτυχίου & εμπειρία)
- Δ' & Ε για εταιρίες

Μητρώα μελετητών δημοσίων έργων

Κατηγορίες μελετών

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3. Μελέτες Οικονομικές
4. Μελέτες Κοινωνικές
5. Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
8. Στατικές Μελέτες
9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
14. Ενεργειακές Μελέτες
15. Μελέτες Βιομηχανιών
16. Μελέτες Τοπογραφίας
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
22. Εδαφολογικές
23. Μελέτες Γεωργικές
24. Μελέτες Δασικές
25. Μελέτες έργων πρασίνου.
26. Μελέτες Αλιευτικές.
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
28. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων
29. Ηλεκτρονικές Μελέτες

Επιλογή 2 κατηγοριών στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών

ΜΕΚ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)

Δικαίωμα εγγραφής:

- Διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη ΤΕΕ,
- Γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι),
- Πτυχιούχοι υπομηχανικοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ

Προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΕΚ:

- Τίτλος σπουδών
- Μη εγγραφή στο μητρώο μελετητών
- Παρέλευση τριετίας από τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος
- Για την αναβάθμιση απαιτείται εμπειρία

Τάξεις:

- Α, Β', Γ', Δ' (πρώτη εγγραφή μόνο μέχρι Β' τάξη)

ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων)

Επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρίες) στελεχωμένες με μηχανικούς κατόχους πτυχίου ΜΕΚ, με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων

Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.	Μορφή	Ανώτατο όριο	Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες	Ανεκτέλεστο
A1	ΕΕ, ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, Ατομική Επιχείρηση, Δημοτική Επιχείρηση	90.000 €	142.500 €	270.000 €
A2		300.000 €	412.500 €	900.000 €
1η		750.000 €	937.500 €	2.250.000 €
2η		1.500.000 €	2.062.500 €	4.500.000 €
3η	ΑΕ	3.750.000 €	4.687.500 €	11.250.000 €
4η		7.500.000 €	11.125.000 €	22.500.000 €
5η		22.000.000 €	27.500.000 €	66.000.000 €
6η		44.000.000 €	60.000.000 €	132.000.000 €
7η		-	-	Ειδ. Διατ.

Εγγραφή μέχρι 3^η τάξη, αναβάθμιση στην 3^η τάξη κατόπιν εμπειρίας & πρόσθετων, κατά περίπτωση, κριτηρίων (ίδια κεφάλαια, πάγια, εξοπλισμός, δείκτες βιωσιμότητας κλπ.)

ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων)

Κατώτατα όρια στελέχωσης (πλην έργων πρασίνου)

		A1	A2	1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ *1		1 ΜΕΚ Α	1 ΜΕΚ Β ή	1 ΜΕΚ Γ ή	1 ΜΕΚ Δ ή	1 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ	2 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή	3 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή	5 ΜΕΚ Δ & 4 ΜΕΚ Γ & 1 ΜΕΚ Β ή	14 ΜΕΚ Δ & 12 ΜΕΚ Γ από αυτά
			2 ΜΕΚ Α	2 ΜΕΚ Β ή	2 ΜΕΚ Γ ή		1 ΜΕΚ Δ & 4 ΜΕΚ Γ ή	2 ΜΕΚ Δ & 4 ΜΕΚ Γ ή	4 ΜΕΚ Δ & 6 ΜΕΚ Γ & 1 ΜΕΚ Β ή	10 ΜΕΚ Δ σε 3 ΚΕ 1 ΜΕΚ Δ Η/Μ & 1 ΜΕΚ Δ Β/Ε
				1 ΜΕΚ Β & 2 ΜΕΚ Α	1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β		2 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β ή	3 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β ή	5 ΜΕΚ Δ & 3 ΜΕΚ Γ & 3 ΜΕΚ Β ή	(Με δυνατότητα αντικατάστασης ως 4 ΜΕΚ Δ με 8 ΜΕΚ Γ & ως 4 ΜΕΚ Γ με 8 ΜΕΚ Β)
							1 ΜΕΚ Δ & 3 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β	2 ΜΕΚ Δ & 3 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β	4 ΜΕΚ Δ & 5 ΜΕΚ Γ & 3 ΜΕΚ Β	
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ *2	Μέχρι και την τέταρτη πρόσθετη κατηγορία	1 ΜΕΚ Α	1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Α	1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Α	1 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Β	1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ	ως τις τρεις επιπλέον κατηγορίες έργων 2 ΜΕΚ Δ ή 1 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β	ως τις τρεις επιπλέον κατηγορίες έργων 3 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β	ως τις τρεις επιπλέον κατηγορίες έργων 4 ΜΕΚ Δ ή 3 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή 3 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β	
	Για τις επιπλέον των τεσσάρων κατηγοριών έργων						πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β	πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β	πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β	

Νόμος 4412/2016

- Κωδικοποιεί τη νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών στη χώρα μας
- Ενσωματώνει τις κοινοτικές οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
- Καταργεί τη μέχρι τότε υφιστάμενη (& κατακερματισμένη) νομοθεσία (Ν.3316/2005, Ν.3669/2008, Ν.1418/1984, κλπ.)
- Διατηρούνται προσωρινά μόνο τα άρθρα που ρυθμίζουν τα μητρώα (ρυθμίζονται με αρ. 118–119 του Ν. 4472/2017 & ΠΔ υπό διαβούλευση)



Νόμος 4412/2016
Γενικές Διατάξεις (αρ. 1- 128)

Ορισμοί (1/2)

- **Αναθέτουσα Αρχή:** Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.
- **Δημόσιες Συμβάσεις Έργων:** συμβάσεις με αντικείμενο την εκτέλεση ή μελέτη & εκτέλεση έργων
- **Οικονομικός φορέας:** το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών
- **Έγγραφο διαδικασίας σύναψης σύμβασης:** κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής που καθορίζει στοιχεία της σύμβασης
- **Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ):** το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
- **Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.):** το πληροφοριακό σύστημα (μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) που έχει ως στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις

Ορισμοί (2/2)

- **Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):** Ανεξάρτητη Αρχή με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας & αποτελεσματικότητας στις δημόσιες συμβάσεις
- **Ανάδοχος:** ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια μέσω της δημόσιας σύμβασης
- **Κύριος του Έργου:** ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή ΔΥ για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση
- **Φορέας κατασκευής του έργου:** η Αναθέτουσα Αρχή που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου
- **Διευθύνουσα υπηρεσία:** η υπηρεσία που επιβλέπει την κατασκευή του έργου
- **Προϊσταμένη Αρχή:** η υπηρεσία που εποπτεύει το έργο με καίριες αρμοδιότητες όπως η έγκριση τροποποίησης όρων σύμβασης
- **Τεχνικό Συμβούλιο:** συλλογικό όργανο εμπειρων μηχανικών που γνωμοδοτεί προς την Προϊσταμένη Αρχή, όταν απαιτείται (ιδίως για ειδικά θέματα), για την έκδοση αποφάσεων

Συμβάσεις

- **Συμβάσεις άνω των ορίων** της κοινοτικής οδηγίας (συμβάσεις > 5.225.000 € για έργα & > 209.000 € για προμήθειες ή μελέτες χωρίς ΦΠΑ - Διακηρύξεις τύπου Α) – ο νόμος αφορά πρωτίστως αυτήν την περίπτωση
- **Συμβάσεις κάτω των ορίων** (αρ. 120-128) της κοινοτικής οδηγίας (συμβάσεις < 5.225.000 € για έργα & < 209.000 € για προμήθειες ή μελέτες χωρίς ΦΠΑ - Διακηρύξεις τύπου Β)
- **Συνοπτικός διαγωνισμός** (αρ. 117) (συμβάσεις < 60.000 € με τουλάχιστον 3 προσφορές από οικονομικούς φορείς εφόσον δραστηριοποιούνται στην περιοχή)
- **Απευθείας ανάθεση** (αρ. 118) (συμβάσεις < 20.000 € μετά από ετήσια εγγραφή στους οικείους καταλόγους και αφού προηγηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση)
- **Συμβάσεις τεχνικής βοήθειας** (αρ. 119) για τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ κλπ.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 3 – 17

- **Μικτές συμβάσεις** (αρ. 4) που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων
- **Μέθοδοι υπολογισμού εκτιμώμενης αξίας σύμβασης** (αρ. 6) πλέον ΦΠΑ, Γ.Ε. & Ο.Ε. & απρόβλεπτα για έργα, μόνο απρόβλεπτα για μελέτες κλπ.
- **Εξαιρέσεις του νόμου** (αρ. 7 – 12) τομείς ενέργειας, υδάτων, μεταφορών & ταχυδρομικών υπηρεσιών
- **Ειδικές περιπτώσεις** (αρ. 13 – 17) επιδοτούμενες συμβάσεις, έρευνα και ανάπτυξη, άμυνα & ασφάλεια

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 18-24

- **Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων** (αρ. 18) τήρηση περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής & εργατικής νομοθεσίας, εθνικού & ευρωπαϊκού δικαίου.
- **Εχεμύθεια & επικοινωνίες** (αρ. 21-22) πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως εμπιστευτικές και απ' τις δυο πλευρές δεν δημοσιεύονται, οι επικοινωνίες για συμβάσεις > 60.000 € γίνονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
- **Σύγκρουση συμφερόντων** (αρ. 24) προσωπικών πολιτικών, οικονομικών οικογενειακών κλπ. Εφόσον θίγεται η αμεροληψία & επηρεάζεται το αποτέλεσμα, αποκλεισμός υποψηφίου.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 25 - 32

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

- **Δικαιούμενοι συμμετοχής & επιλογή διαδικασιών** (αρ.25 - 26)
- **Διαδικασίες:**
 1. **Ανοικτή διαδικασία** (αρ. 27) κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά
 2. **Κλειστή διαδικασία** (αρ. 28) κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, προσφορά υποβάλλουν όσοι προσκαλούνται να το πράξουν
 3. **Διαδικασία με διαπραγμάτευση** (αρ. 29) των όρων της σύμβασης
 4. **Ανταγωνιστικός διάλογος** (αρ. 30) των διαφόρων πτυχών της σύμβασης
 5. **Σύμπραξη καινοτομίας** (αρ. 31) αν οι ανάγκες δεν εξυπηρετούνται απ' την υπάρχουσα αγορά
 6. **Διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη** (αρ. 32) για ειδικές περιπτώσεις & περιστάσεις

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 33 - 43

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

- **Δυναμικά συστήματα αγορών** (αρ. 33 - 35)
- **Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων** - ΕΣΗΔΗΣ (αρ. 36, 37) Πλατφόρμα διαδικασιών σύναψης συμβάσεων > 60.000 €, promitheus.gov.gr
- **Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ)** (άρθρο 38) Μητρώο συλλογής, επεξεργασίας δημοσιοποίηση συμβάσεων αξίας > €1.000 προ ΦΠΑ (Ν. 4013/2011)
- **Συγκεντρωτικές διαδικασίες**
 - ❖ Συμφωνία – πλαίσιο (αρ. 39)
 - ❖ Κεντρικές δραστηριότητες αγορών – ΚΑΑ (40-41)

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 44 - 51

Προετοιμασία Αναθέτουσας Αρχής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας

- **Τεχνική επάρκεια** (αρ. 44) ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση, διαφορετικά προγραμματική σύμβαση
- **Φάκελος Σύμβασης** (αρ. 45) καθ' όλα τα στάδια, προδιαγράφονται ελάχιστες απαιτήσεις
- **Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις** (αρ. 46 & 47) με την αγορά για προετοιμασία της διαδικασίας
- **Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίου στη διαδικασία** (αρ. 48) μέτρα διασφάλισης διαδικασίας
- **Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα** (αρ. 49) εξασφάλιση χρηματοδότησης, απαλλοτριώσεις, μελέτες, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, μετακίνηση δικτύων ΟΚΩ, κλπ.
- **Ανάθεση έργου με αξιολόγηση μελέτης** (αρ. 50) μελέτη & κατασκευή απ' τον οικονομικό φορέα
- **Σύμβαση μελέτης για προσδιορισμό τεχνικής λύσης** (αρ. 51) όταν αυτή δεν έχει προσδιοριστεί, πρόβλεψη για απονομή βραβείων.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 53 - 60

Διεξαγωγή της διαδικασίας

- **Περιεχόμενο εγγράφων σύμβασης** (αρ. 53) Διακήρυξη, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχη Τεχνικών Μελετών κλπ.
- **Τεχνικές προδιαγραφές** (αρ. 54) επαρκής καθορισμός των απαιτήσεων για τα έργα.
- **Εναλλακτικές προσφορές** (αρ. 57) υποβάλλονται εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται.
- **Υπεργολαβία** (αρ. 58) αναφορά για τυχόν υπεργολάβους που θα χρησιμοποιηθούν.
- **Διαδικασία ανάθεσης σε τμήματα** (αρ. 59) διαίρεση της συμβάσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
- **Προθεσμίες παραλαβής προσφορών** (αρ. 60)

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 61 - 70

Δημοσιότητα & διαφάνεια

- **Έναρξη διαδικασίας** (αρ. 61) ο χρόνος της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ή το ΚΗΜΔΗΣ
- **Προκαταρκτικές προκηρύξεις** (αρ. 62) γνωστοποίηση των προθέσεων της Αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις
- **Προκηρύξεις σύμβασης** (αρ. 63) για έργα κάτω των ορίων (στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής, δαπάνη, κλπ)
- **Γνωστοποίηση συναφθεισών συμβάσεων** (αρ. 64) για άνω των ορίων εντός 30 ημερών (αρ. 65)
- **Δημοσίευση προκηρύξεων** (αρ. 65 ως 69) & διαβούλευση επ' αυτών, ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων, προσκλήσεις υποψηφίων (για κλειστές διαδικασίες)
- **Ενημέρωση υποψηφίων** (αρ. 70) για την εξέλιξη των διαδικασιών της σύμβασης, κατόπιν αιτήσεως για τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης της συμμετοχής ή της προσφοράς τους κλπ.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 71 - 83

Ανάθεση σύμβασης

- **Γενικές αρχές** (αρ. 71) ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
- **Εγγυήσεις** (αρ. 72) συμμετοχής (2%), καλής εκτέλεσης (5%), προκαταβολής, καλής λειτουργίας.
- **Λόγοι αποκλεισμού** (αρ. 73) δωροδοκία, δωροληψία, απάτη, τρομοκρατία, αθέτηση οικ. υποχρεώσεων.
- **Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις** (αρ. 74) ανάλογα με το αδίκημα (έως 5 έτη)
- **Κριτήρια επιλογής για ανάθεση συμβάσεων** (αρ. 75 - 78) καταλληλότητα άσκησης δραστηριότητας, οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική & επαγγελματική ικανότητα, εγγραφή στα μητρώα.
- **Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής** (αρ. 79-83) ευρωπαϊκό έγγραφο σύμβασης για άνω των ορίων, αποδεικτικά μέσα (ενημερότητες, ποινικά μητρώα κλπ.), e-Certis, μητρώα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ΜΕΕΠ (αρ. 118-119 του Ν. 4472/2017 & ΠΔ υπό διαβούλευση).

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 86 - 91

Κριτήρια Ανάθεσης σύμβασης

- **Κριτήρια ανάθεσης** (αρ. 86 - 87) Πλέον συμφέρουσα προσφορά α) βάσει τιμής β) βάσει κόστους αποτελεσματικότητας (κύκλος ζωής), βάσει κριτηρίων (σχέση ποιότητας – τιμής). Για μελέτες πρόσθετα κριτήρια (βαθμός κατανόησης αντικειμένου, πληρότητα & αξιοπιστία μεθοδολογίας, χρονοδιάγραμμα, οικονομικά στοιχεία φορέα κ.ά.).
- **Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές** (αρ. 88 - 89) πρόσκληση (εντός 10 ημερών) για αιτιολόγηση των, προσκόμιση δικαιολογητικών κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων, επιδοτούμενων συμβάσεων κλπ.
- **Ισότιμες & ισοδύναμες προσφορές** (αρ. 90) αν το κριτήριο είναι αποκλειστικά η τιμή προσφοράς, διενεργείται κλήρωση, σε περιπτώσεις μελετών ή έργων με περισσότερα κριτήρια, κατακυρώνεται σε αυτόν με τη μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία.
- **Λόγοι απόρριψης προσφοράς** (αρ. 91) παράβαση των όρων της διακήρυξης, ελλείψεις, ασάφειες, σφάλματα, μη παροχή διευκρινήσεων που ζητήθηκαν κλπ.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 93 - 97

Προσφορές & αιτήσεις συμμετοχής

- **Περιεχόμενα προσφοράς** (αρ. 93 - 95) δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληροί τα κριτήρια επιλογή, εγγύηση συμμετοχής), τεχνική προσφορά (εάν απαιτείται), οικονομική προσφορά.
- **Χρόνος & τόπος υποβολής προσφορών** (αρ. 96) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο (φυσική παρουσία, ταχυδρομείο κλπ.) και διατηρούνται σφραγισμένες μέχρι την αποσφράγιση. Για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προσφορές & δικαιολογητικά υποβάλλονται στην πλατφόρμα σε μορφή pdf υπογεγραμμένα ψηφιακά χωρίς φυσική παρουσία.
- **Χρόνος ισχύος προσφορών** (αρ. 97) για έργα ορίζεται στη διακήρυξη.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 98 - 106


Στάδια διαδικασίας

- **Αποσφράγιση προσφορών** (αρ. 98 - 101) έλεγχος δικαιολογητικών, σύνταξη πρακτικού, προσωρινός μειοδότης.
- **Συμπληρώσεις – αποσαφηνίσεις** (αρ. 102) για επουσιώδη θέματα, εάν ζητηθούν, εντός 7 ημερών.
- **Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών** (αρ. 103) στον προσωρινό μειοδότη εντός 10-20 ημερών, έλεγχος, έγκριση του πρακτικού (διαφορετικά αποκλεισμός & κατάπτωση εγγυητικής).
- **Κατακύρωση – σύναψη συμβάσης** (αρ. 105) πρόσκληση στο μειοδότη εντός 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης. Αν δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον επόμενο μειοδότη.
- **Ματαίωση διαδικασίας** (αρ. 106) άγονος διαγωνισμός αν ασύμφορη προσφορά, ανωτέρα βία, κ.ά.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 124 - 128

Οικονομικές προσφορές – ενστάσεις

- **Οικονομικές προσφορές** (αρ. 124 - 126) εκφράζονται είτε ως επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ή ως ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ($< 60.000 \text{ €}$) ή ως έκπτωση στο όφελος για απόλογιστικές εργασίες ($< 250.000 \text{ €}$).
- **Ενστάσεις** (αρ. 127) για έργα $< 60.000 \text{ €}$ εντός 5 ημερών στην Αναθέτουσα Αρχή, με καταβολή παράβολου (1%) που επιστρέφεται αν γίνει η ένσταση δεκτή.
- **Εξειδικευμένοι σύμβουλοι** (αρ. 128) για έργα $> 30.000.000 \text{ €}$ ή εμπειρογνώμονες (εγνωσμένου κυρούς) σε περιπτώσεις έργων ή μελετών όπου εφαρμόζονται μη διαδεδομένες μέθοδοι κατασκευής.

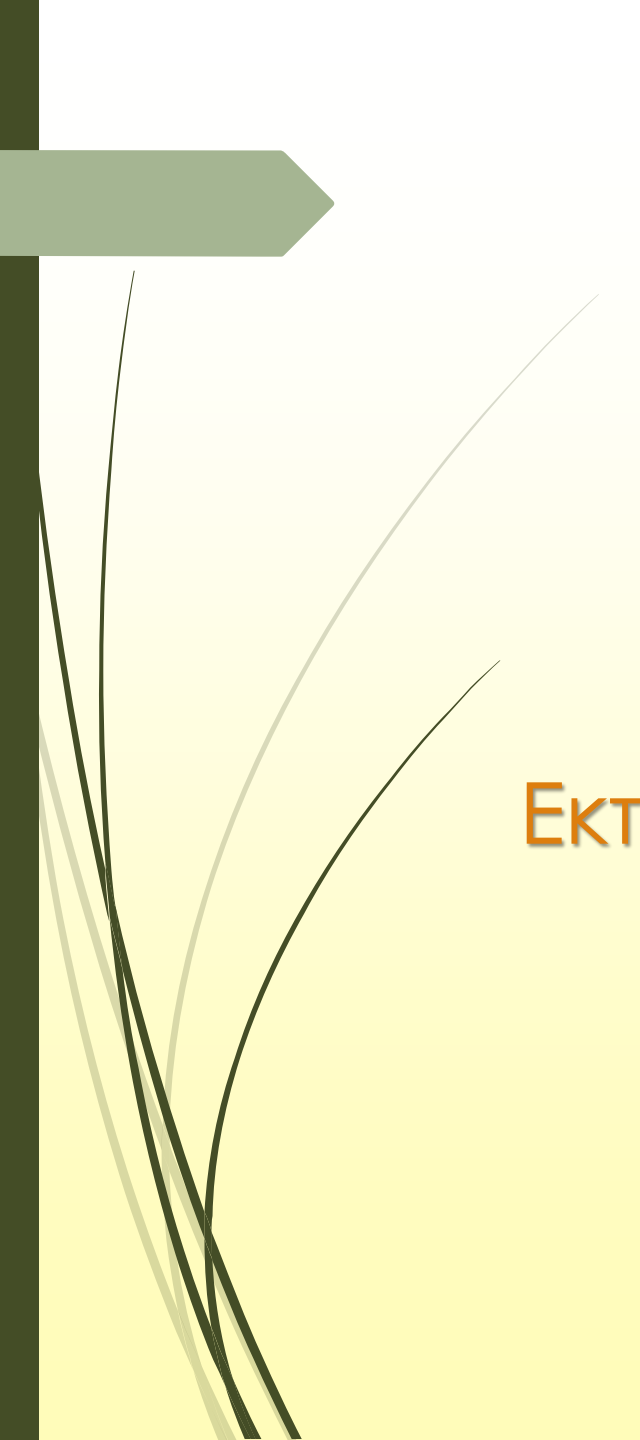

Νόμος 4412/2016
Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
(αρ. 129- 181)

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 129 - 135

Εκτέλεση σύμβασης

- **Συμβατικό πλαίσιο – νομοθεσία** (αρ. 129) Ν.4412/2016, όροι σύμβασης, αστικός κώδικας.
- **Όροι εκτέλεσης της συμβάσης** (αρ. 130) τήρηση περιβαλλοντικού, κοινωνικού, ασφαλιστικού, εθνικού δίκαιου, Δύναται να επιβληθούν πρόσθετοι κοινωνικοί όροι (καινοτομία, απασχόληση)
- **Υπεργολαβία** (αρ. 131) εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση (για εκτέλεση εργασιών > 30 %)
- **Τροποποίηση της σύμβασης** (αρ. 132) έως 15% χωρίς και έως & 50 % με Συμπληρωματική Σύμβαση
- **Μονομερής λύση της σύμβασης** (αρ. 133) εφόσον υπάρξουν ουσιώδεις τροποποιήσεις (απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) ή ακαταλληλότητα Αναδόχου.
- **Υπογραφή συμβάσης** (αρ. 135) περιλαμβάνει τις εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, έκπτωση, αναθεώρηση, ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει αντίκλητο.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 136 - 140

Διοίκηση & διαχείριση έργου

- **Ορισμός επιβλεπόντων** (αρ. 136) υπάλληλοι της διευθύνουσας υπηρεσίας, επιτροπή Π.Α.Ε.
- **Υπερημερία αναδόχου** (αρ. 137) μη εκπλήρωσή συμβατικών όρων από πλευράς Κυρίου το έργου έγγραφη όχληση & δικαίωμα αποζημίωσης μόνο για θετικές ζημίες (όχι διαφυγόντα κέρδη).
- **Υποχρεώσεις αναδόχου** (αρ. 138) τήρηση της μελέτης και των εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, της νομοθεσίας, καταβολή φόρων, εισφορών κλπ.
- **Διεύθυνση του έργου απ' την πλευρά του αναδόχου** (αρ. 139) απαιτείται ελάχιστη προβλεπόμενη στελέχωση.
- **Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας** (αρ. 140) ευθύνη από κοινού έναντι του Κυρίου του έργου, ορισμός εκπροσώπου με συμβολαιογραφική πράξη.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 141 - 144

Διοίκηση & διαχείριση έργου

- **Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων** (αρ. 141) για παραλείψεις, καθυστερήσεις, επιβολή ποινών στέρησης μισθού έως 6 μήνες είτε παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
- **Συμβουλευτική επιτροπή παρακολούθησης έργου** (αρ. 142) συγκροτείται για σημαντικά έργα.
- **Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση** (αρ. 143) email, fax, με υπάλληλο της υπηρεσίας, με δικαστικό επιμελητή (με αποδεικτικό παραλαβής) ή παράδοση στον εκπρόσωπο του Αναδόχου.
- **Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή** (αρ. 144) για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της μελέτης (λόγω σφαλμάτων ή παραλείψεων) εντός εξαετίας απ' την παραλαβή της μελέτης ή (αργότερα) τις τροποποιήσεις αναλαμβάνει ο ανάδοχος σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα (η πρόσθετη αμοιβή βαρραίνει τις πιστώσεις του έργου).

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 145 - 149

Διοίκηση & διαχείριση έργου

- **Χρονοδιάγραμμα** (αρ. 145) υποβάλλεται 15-30 μέρες από σύμβαση & εγκρίνεται απ' την υπηρεσία. Για έργα > 1.000.000 € απαιτείται δικτυωτό διάγραμμα. Απαιτείται επίσης οργανόγραμμα εργοταξίου.
- **Ημερολόγιο έργου** (αρ. 146) το συμπληρώνει ο Ανάδοχος, περιέχει στοιχεία για καιρικές συνθήκες, προσωπικό μηχανήματα υλικά, εντολές υπηρεσίας κλπ. Προβλέπονται ειδικές ποινικές ρήτρες για μη τήρηση του.
- **Προθεσμίες** (αρ. 147) έναρξης, τμηματικές, συνολική. Αναφέρεται επίσης η διαδικασία έγκρισης παρατάσεων (με ή χωρίς αναθεώρηση).
- **Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών** (αρ. 144) γενικά έως 6% της αξίας της σύμβασης (έως 9% σε ειδικές περιπτώσεις).
- **Επιτάχυνση εργασιών ρήτρα πρόσθετης καταβολής** (πριμ) (αρ. 149) για ταχύτερη εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού (εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση).

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 150 - 155

Διοίκηση & διαχείριση έργου

- **Προκαταβολές** (αρ. 150) για εγκατάσταση εργοταξίου & αγορά υλικών (έως 15% της αξίας της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται), τμηματική απόσβεση προκαταβολής με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
- **Επιμετρήσεις** (αρ. 151) συντάσσονται απ' τον ανάδοχο και εγκρίνονται από την υπηρεσία εντός 45 ημερών, διαφορετικά θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες για πληρωμή. Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ). Τελική επιμέτρηση.
- **Λογαριασμοί – πιστοποιήσεις** (αρ. 152) συντάσσονται τμηματικά και ανακεφαλαιωτικά (όλες οι προηγούμενες εργασίες που έχουν υλοποιηθεί), εγκρίνονται εντός μηνός από την υποβολή τους. Η πληρωμή γίνεται με βάση τον εκάστοτε συνολικό λογαριασμό αφού αφαιρεθούν οι προηγούμενες πληρωμές. Σε κάθε πληρωμή γίνονται κρατήσεις 5% στην αξία των εργασιών και 10% στην αξία των υλικών (θα αποδοθούν στον ανάδοχο με την παραλαβή του έργου).
- **Αναθεωρήσεις τιμών** (αρ. 153) λόγω ενδεχόμενης διαφοροποίησης τιμών των εργασιών κατά τους χρόνους δημοπράτησης και εκτέλεσης έργου.
- **Απολογιστικές εργασίες** (αρ. 154) για μηχανήματα, ημερομίσθια ή υλικά (έκπτωση στο όφελος).
- **Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες** (αρ. 155) είναι δυνατή η έγκριση εκτέλεσης τέτοιων εργασιών πριν την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) έως 15% της αξίας της σύμβασης.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 156 - 159

Διοίκηση & διαχείριση έργου

- **Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες** (αρ. 156) συντάσσονται Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ), Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
- **Βλάβες στα έργα - αποζημιώσεις** (αρ. 157) μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για βλάβες (πλην αυτών από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή ανωτέρα βία) τις οποίες οφείλει να διορθώσει (για αυτές που δεν είναι υπαίτιος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση).
- **Πρόγραμμα ποιότητας έργου** (αρ. 158) κωδικοποιεί τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις εκτέλεσης του έργου σε πλήρη εναρμόνιση με το χρονοδιάγραμμα, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης & διοίκησης τη συγκέντρωση στοιχείων & την αρχειοθέτηση τους.
- **Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παραλείψεις συντήρησης** (αρ. 159) διαδικασία αντικατάστασης υλικών ή αποκατάστασης ελαττωμάτων και κακοτεχνιών.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 160 - 167

Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση σύμβασης – Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Πτώχευση

- **Έκπτωση αναδόχου** (αρ. 160) για μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, καθυστερήσεις, συστηματικές κακοτεχνίες κλπ.
- **Διακοπή εργασιών - διάλυση σύμβασης** (αρ. 161) με υπαιτιότητα είτε του Αναδόχου είτε του φορέα.
- **Αποζημίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης** (αρ. 163) περιλαμβάνει την αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί, την αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων, και το τεκμαιρόμενο όφελος από τη συνέχιση της σύμβασης.
- **Υποκατάσταση αναδόχου** (αρ. 164) εκχώρηση μέρους ή όλου του έργου σε τρίτους (δεν αφορά την υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου) κατόπιν έγκρισης της Προϊσταμένης Αρχής.
- **Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση και όροι έγκρισης** (αρ. 165-166) με προϋποθέσεις: διατήρηση απ' τον ανάδοχο > 70% της αξίας της σύμβασης, υπεργολάβος αντιστοίχων προσόντων, υποβολή φακέλου δικαιολογητικών και έγκριση.
- **Πτώχευση – Θάνατος** (αρ. 167) πτώχευση αναδόχου οδηγεί αυτοδίκαια σε διάλυση της σύμβασης, θάνατος φυσικού προσώπου σε κοινοπραξία οδηγεί σε συνέχιση του έργου από τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 168 - 173


Ολοκλήρωση & Παραλαβή του έργου

- **Βεβαίωση περαίωσης εργασιών** (αρ. 168) έκδοση της από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μετά από αναφορά των επιβλεπόντων, εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών.
- **Διοικητική παραλαβή για χρήση** (αρ. 169) κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου.
- **Προσωρινή παραλαβή έργου** (αρ. 170) μετά από έλεγχο των εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά από ειδική επιτροπή παραλαβής, εντός εξαμήνου από την περαίωση και εφόσον οι τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε εντός δίμηνου από την περαίωση.
- **Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων** (αρ. 171) από τον Ανάδοχο, συνήθως 15 μήνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
- **Οριστική παραλαβή** (αρ. 172) μετά από έλεγχο της επιτροπής παραλαβής όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών (του έργου) μετά την παρέλευση του 15μηνου για τη συντήρηση. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
- **Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου** (αρ. 173) οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση του Αναδόχου παραγράφονται αν δεν ασκηθούν εντός 4μήνου από την εμφάνιση της γενεσιουργού αιτίας τους.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 174 – 176, 345 - 375

Επίλυση διαφορών

- **Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών** (αρ. 174) ένσταση εντός 15ημέρου (προς την προϊσταμένη αρχή), αν απορριφθεί, αίτηση θεραπείας (προς τον Υπουργό Υπο.Με.Δι. ή άλλο αρμόδιο όργανο) εντός τριμήνου.
- **Δικαστική επίλυση διαφορών** (αρ. 175) προσφυγή στο αρμόδιο πολιτικό ή διοικητικό εφετείο εντός 2μήνου από την απόρριψη της αίτησης θεραπείας.
- **Διαιτητική επίλυση διαφορών** (αρ. 176) εφόσον έχει προβλεφθεί σχετική ρήτρα στη σύμβαση.
- **Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων** (αρ. 345 – 375) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και σε περιπτώσεις απορριπτικής απόφασης προσφυγή για αναστολή εκτέλεσης & ακύρωση της στο Διοικητικό εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Κατάθεση Παράβολου αξίας 1 % του Προϋπολογισμού.

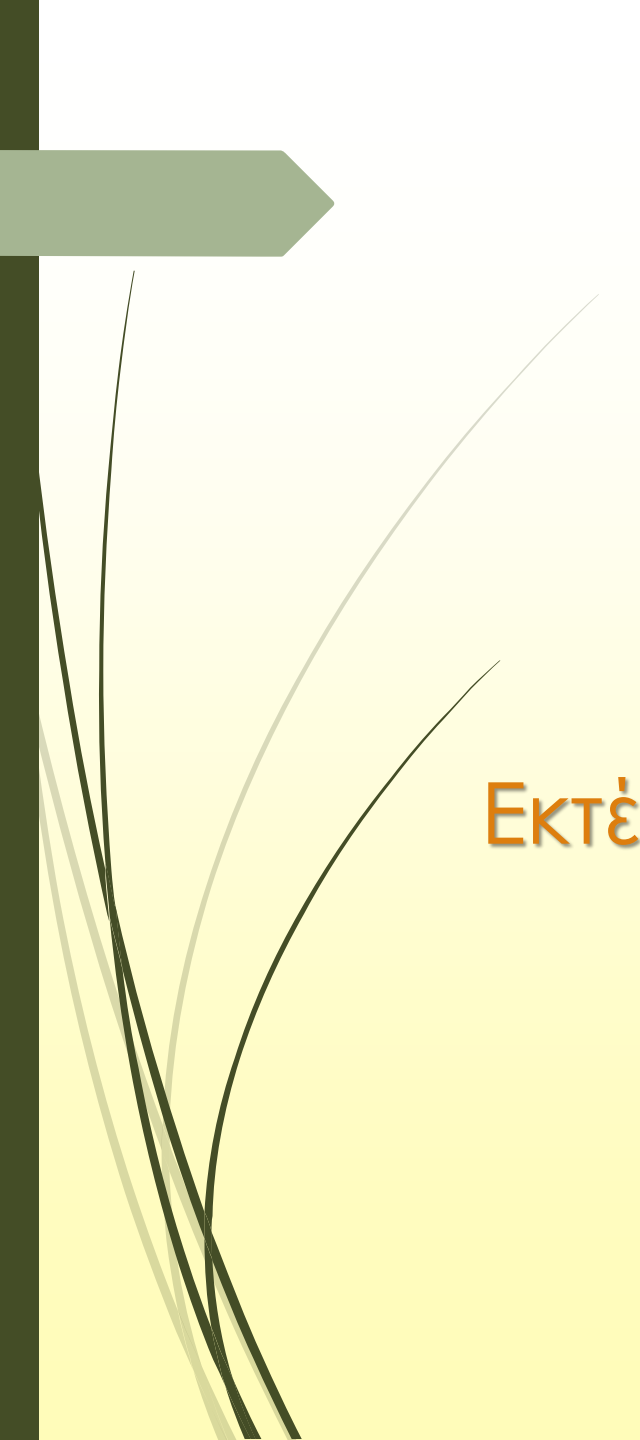

Νόμος 4412/2016
Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών
(αρ. 182- 199)

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 182 - 187

Διοίκηση – Διαχείριση της Σύμβασης

- **Υπογραφή σύμβασης** (αρ. 182) γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Αναδόχου, σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, έκπτωση του με δικαίωμα ένστασης εντός 15ημέρου.
- **Διοίκηση σύμβασης μελέτης** (αρ. 183) Ορισμός επιβλεπόντων (παρακολούθηση συμβάσης, έλεγχος λογαριασμών, ΑΠΕ κλπ., ενημέρωση φακέλου), για παραλείψεις πειθαρχικός έλεγχος.
- **Προθεσμίες – χρονοδιάγραμμα** (αρ. 184) Συνολική προθεσμία = καθαρός χρόνος + πρόσθετος χρόνος καθυστερήσεων (π.χ. εργαστηριακές δοκιμές). Υποβολή χρονοδιαγράμματος. Παράταση προθεσμίας με αίτηση.
- **Ποινικές ρήτρες** (αρ. 185) για παράβαση προθεσμιών.
- **Τροποποίηση σύμβασης** (αρ. 186) σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, σύνταξη Α.Π.Ε., Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Εάν ο μελετητής δεν καλύπτει την κατηγορία των προσθέτων εργασιών, απαιτείται σύμπραξη.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 187 - 189

Διοίκηση – Διαχείριση της Σύμβασης

- **Καταβολή αμοιβής αναδόχου** (αρ. 187) γενικά καταβάλλεται με την υποβολή της μελέτης (κατ' αποκοπή αμοιβή), σε περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων μελέτης, καταβάλλεται τμηματικά μετά την υποβολή, έγκριση & παραλαβή (επιμέτρηση, λογαριασμός). Χορήγηση προκαταβολής είναι εφικτή, εάν προβλέπεται στη σύμβαση. Ερευνητικές – υποστηρικτικές εργασίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα.
- **Υποχρεώσεις αναδόχου – Πρόγραμμα ποιότητας** (αρ. 188) όροι συμβάσης, τεχνικοί κανονισμοί. Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης. Ελλείψεις – ελαττώματα πρόσκληση αποκατάστασης (εξαετές δικαίωμα αξιώσεων του εργοδότη σε περίπτωση πλημμελούς εκπόνησης).
- **Έγκριση της μελέτης – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης** (αρ. 189) η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια (προσωρινή παραλαβή) και στο σύνολό της (οριστική παραλαβή). Απόφαση έγκρισης εντός 2 μηνών από την τελική υποβολή.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 190 - 193

Διοίκηση – Έκπτωση αναδόχου – Διάλυση σύμβασης

- **Αποζημίωση αναδόχου λόγω υπερημερίας εργοδότη** (αρ. 190) αποζημίωση για θετικές ζημίες κατόπιν υποβολής έγγραφης όχλησης και συγκρότησης τριμελούς επιτροπής.
- **Έκπτωση του αναδόχου** (αρ. 191) εφόσον δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης η οποία επιδέχεται ένστασης.
- **Διάλυση σύμβασης** (αρ. 192) Από την πλευρά του εργοδότη (ουσιώδεις τροποποιήσεις, ακαταλληλότητα αναδόχου) ή με την ολοκλήρωση τμήματος της μελέτης εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται. Από την πλευρά του Αναδόχου εφόσον υπερβεί η οριακή προθεσμία χωρίς υπαιτιότητα του ή ανασταλεί η εκπόνηση με εντολή εργοδότη πέραν του τριμήνου.
- **Ματαίωση διάλυσης** (αρ. 193) με σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου & έγκριση της Π.Α.

Περιεχόμενα Ν. 4412/2016 αρ. 194 - 199

Διοίκηση – Έκπτωση αναδόχου – Διάλυση σύμβασης

- **Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης** (αρ. 194) σε ενιαία μελέτη η αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται σε 10% του υπολειπόμενου αντικειμένου της μελέτης, σε κατά στάδια μελέτη ανέρχεται σε 30% του υπολειπόμενου αντικειμένου του υπό εκπόνηση σταδίου και σε 10 % για όλα τα υπόλοιπα στάδια.
- **Υποκατάσταση του αναδόχου** (αρ. 195) μελετητής ο οποίος απεβίωσε, διεγράφη από τα μητρώα ή κατέστη ανίκανος λόγος ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας, μπορεί να υποκατασταθεί από άλλο μελετητή ή να λυθεί η σύμβαση αυτοδίκαια. Σε περίπτωση κοινοπραξίας μελετητών, η εκπόνηση της μελέτης συνεχίζεται από τα υπόλοιπα μέλη.
- **Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών** (αρ. 198) προβλέπεται ένσταση (εντός 15 ημερών), αίτηση θεραπείας (εντός 45 ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της έντασης ή 2 μηνών από την άπρακτη περίοδο εξέτασης της).

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Διεύθυνση Μητρώων ΥΠΟΜΕΔΙ

<http://www.ypexd15.gr>

Νόμος 4412/2016

με όλες τις παραπομπές (μπλε χρώμα) & τις τροποποιήσεις (κόκκινο χρώμα)

<http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html>

ή σε μορφή pdf (χωρίς παραπομπές και τροποποιήσεις)

http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/N4412_2016.pdf



Τέλος παρουσίασης
